



PRACTICA PROFESIONAL



Hospital San Vicente de Paúl

AVANCE I

Proyecto: Desarrollo y mantenimiento
de sistemas para el Hospital

Área: Desarrollo de software –CGI

Estudiante:
Ivonne de Jesús Guzmán Salas

Carrera: ISW

Institución:
Universidad Técnica Nacional (UTN)

Fecha: 10-10-2025



INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al primer avance del proyecto, cuyo objetivo principal es apoyar al área de desarrollo del hospital en la creación y mantenimiento de sistemas informáticos que optimicen los procesos internos.

El área de Desarrollo se encarga de diseñar, mantener y mejorar los programas que apoyan la gestión hospitalaria, especialmente aquellos relacionados con sistemas de mantenimiento interno, control de equipos y gestión de accesos, así como soporte a herramientas como el EDUS.

Durante este primer periodo se realizaron actividades de levantamiento de requerimientos, análisis de necesidades, reuniones técnicas y desarrollo de instrumentos de apoyo (formularios y matrices de riesgos, base de datos).

CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO

Semana(s)	Actividad
1-2	Investigación preliminar y levantamiento de requerimientos
3-4	Diseño de base de datos y prototipos de aplicaciones




SEMANA 1 – ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades planeadas:

Recolección de requerimientos con la empresa encargada de cámaras y agujas del parqueo (100%).
Análisis de las necesidades del hospital respecto a las excepciones de ingreso de vehículos al parqueo (100%).

Actividades no planeadas:

Inicio de la matriz de riesgos (90%).
Reunión de coordinación con la empresa ISS (100%).

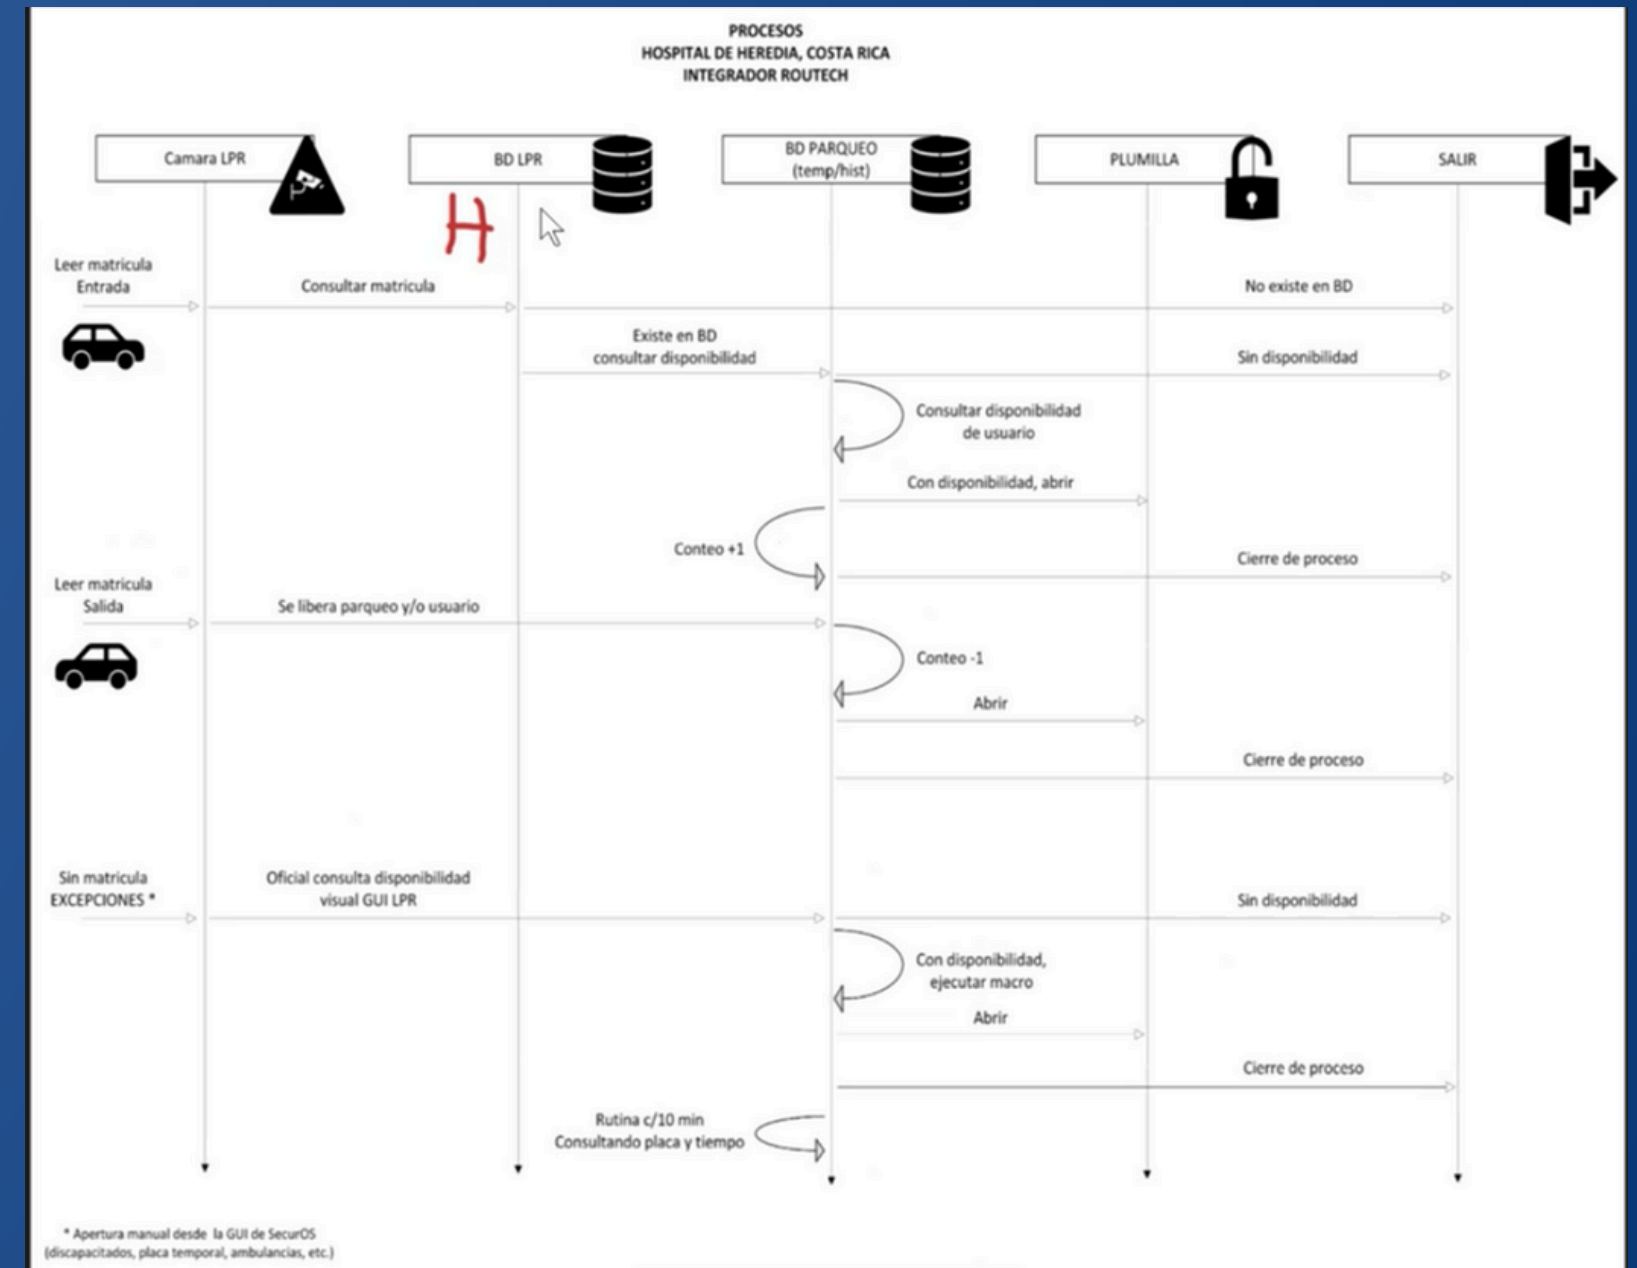

Se obtuvieron los requerimientos iniciales del sistema de control vehicular y se identificaron riesgos preliminares en el proceso.

SEMANA 2 – ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades planeadas:

Formulación de preguntas para el formulario de recolección de datos para la base de datos (100%).


Reunión para definir los requerimientos del sistema interno de mantenimiento y del sistema de la empresa (100%).

Actividades no planeadas:

Continuación de la matriz de riesgos (95%).

Inicio de levantamiento de requerimientos para solicitudes de equipos (50%).

Se definieron los elementos técnicos y funcionales que alimentarán la base de datos y se afinaron los objetivos del sistema de mantenimiento.

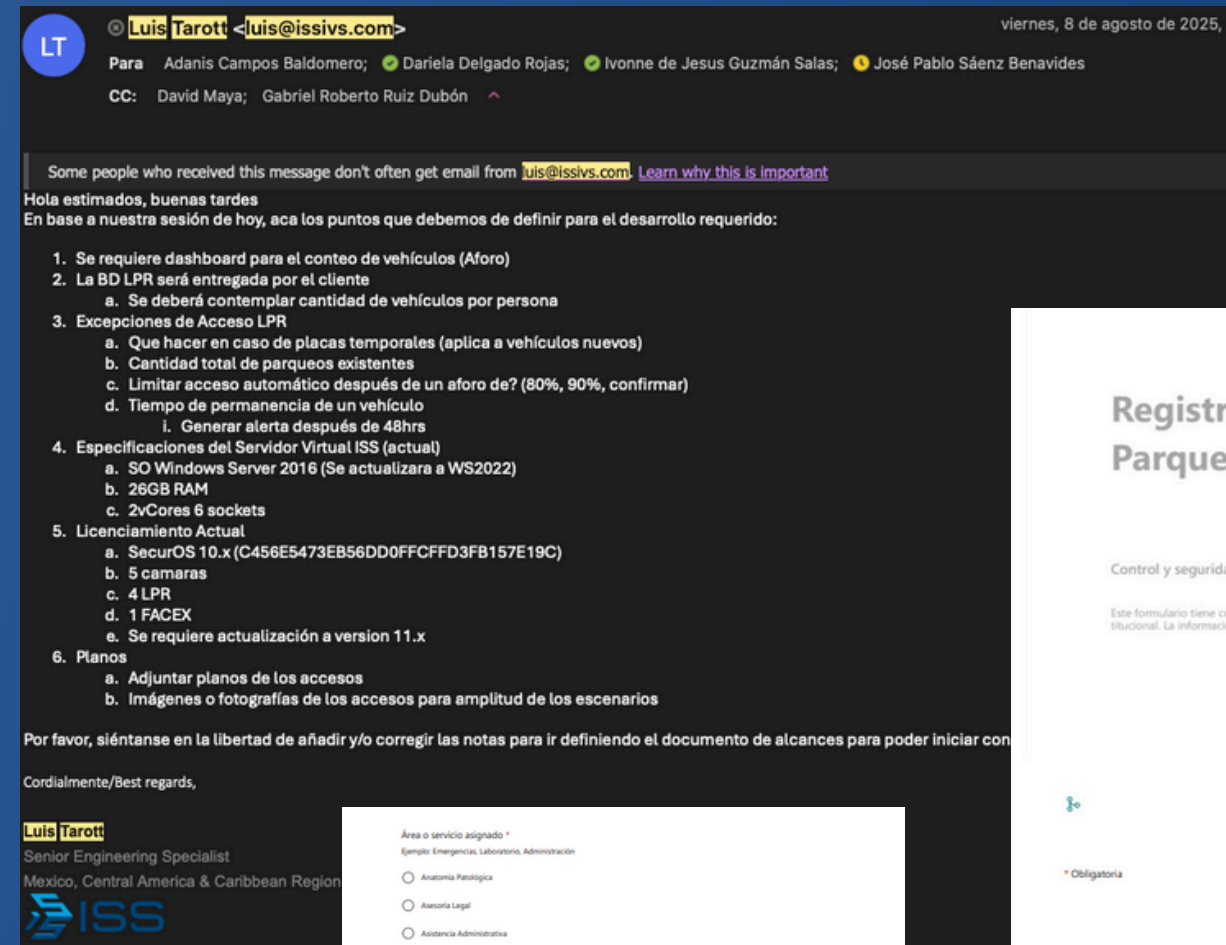

Registro de Vehículos y Personal - Parqueo HSVP

Control y seguridad en el acceso vehicular del parqueo.

Este formulario tiene como objetivo recopilar la información necesaria de vehículos y personal para el control de acceso institucional. La información será utilizada únicamente con fines de seguridad y administración del parqueo.

*** Obligatoria**

Nombre Completo *
Ingrese su nombre tal y como aparece en su cédula.

Nombre Completo

Nombre Completo

Identificación *
Ejemplo: 123456789

Identificación

Identificación


SEMANA 3 – ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades planeadas:

Se realiza la creación de la base de datos según los requerimientos(100%)
b. Se realiza otra reunión para definir la base de datos final, que se debe agregar o quitar de la misma (100%)

Actividades no planeadas:

Se plantea un powerapps para las jefaturas de servicios para solicitar espacio en los parqueos(60%)
Se inicia levantamiento de requerimientos del powerapps (60%).

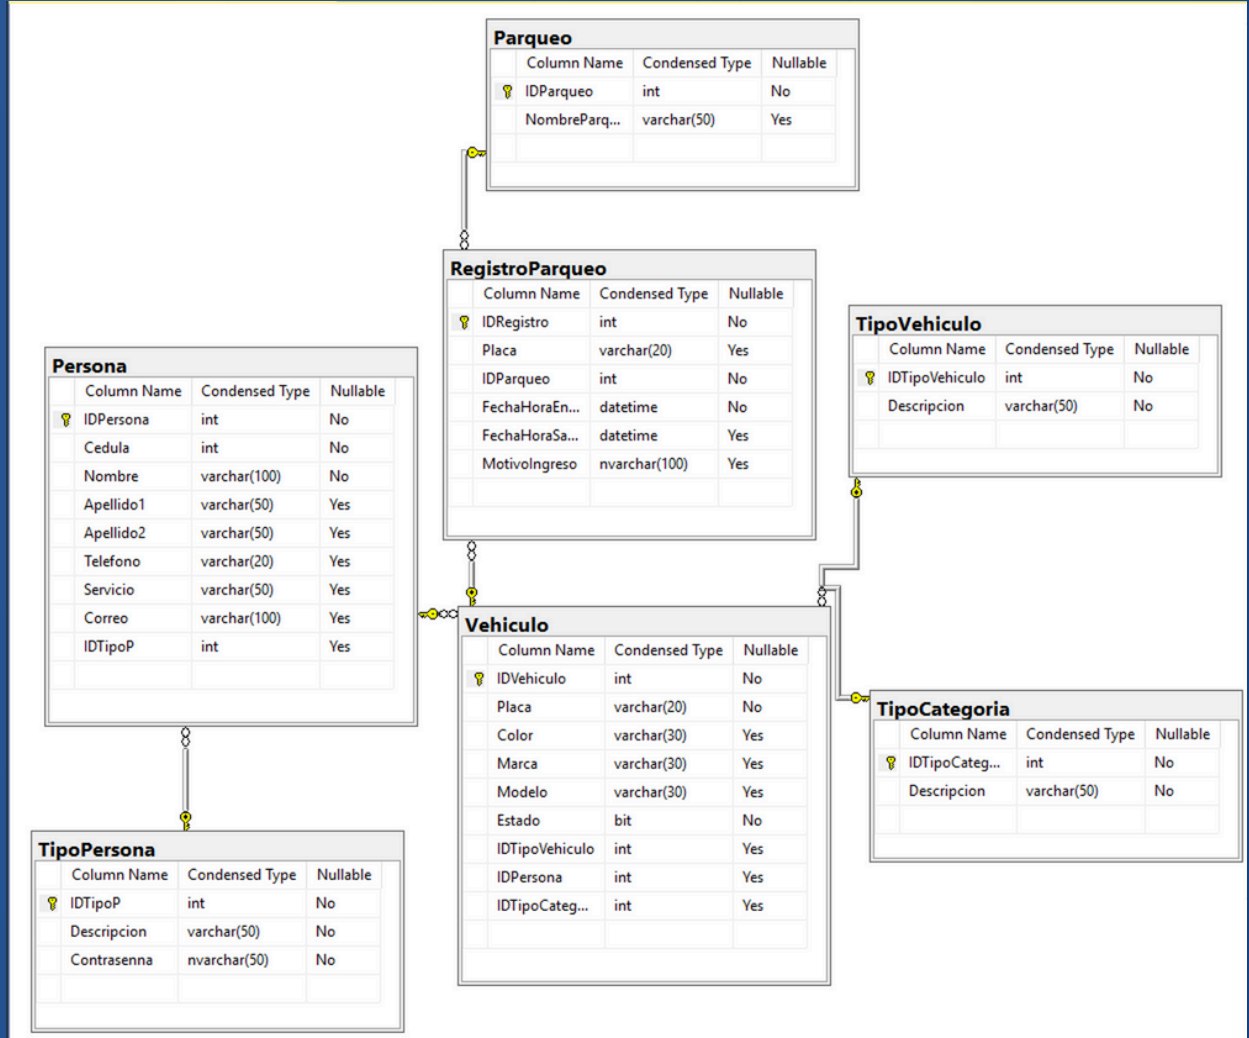

RF13	Se deberá de tener un <u>power apps</u> para que las jefaturas de cada departamento realicen la solicitud al administrador del sistema para agregar o eliminar algún vehículo.	Alto
RF14	El <u>power apps</u> debe de tener dos vistas el administrador y la vista de usuario.	Alto
RF15	El usuario debe de tener la opción en el <u>power apps</u> para agregar vehículo, eliminar vehículo o solicitar reporte.	Alto
RF16	En la sección de “Agregar” en el <u>power apps</u> el usuario debe de llenar la siguiente información: nombre del funcionario, primer apellido del <u>funcionario</u> , segundo apellido del funcionario, número del teléfono, correo electrónico, servicio en donde trabaja, placa del vehículo, color del vehículo y marca del vehículo.	Alto



SEMANA 4 – ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades planeadas:

Desarrollo del prototipo del sistema.
Pruebas iniciales de diseño y conexión con la base de datos.

Actividades no planeadas:

Retroalimentación de los usuarios del hospital del uso de la herramienta Sharepoint

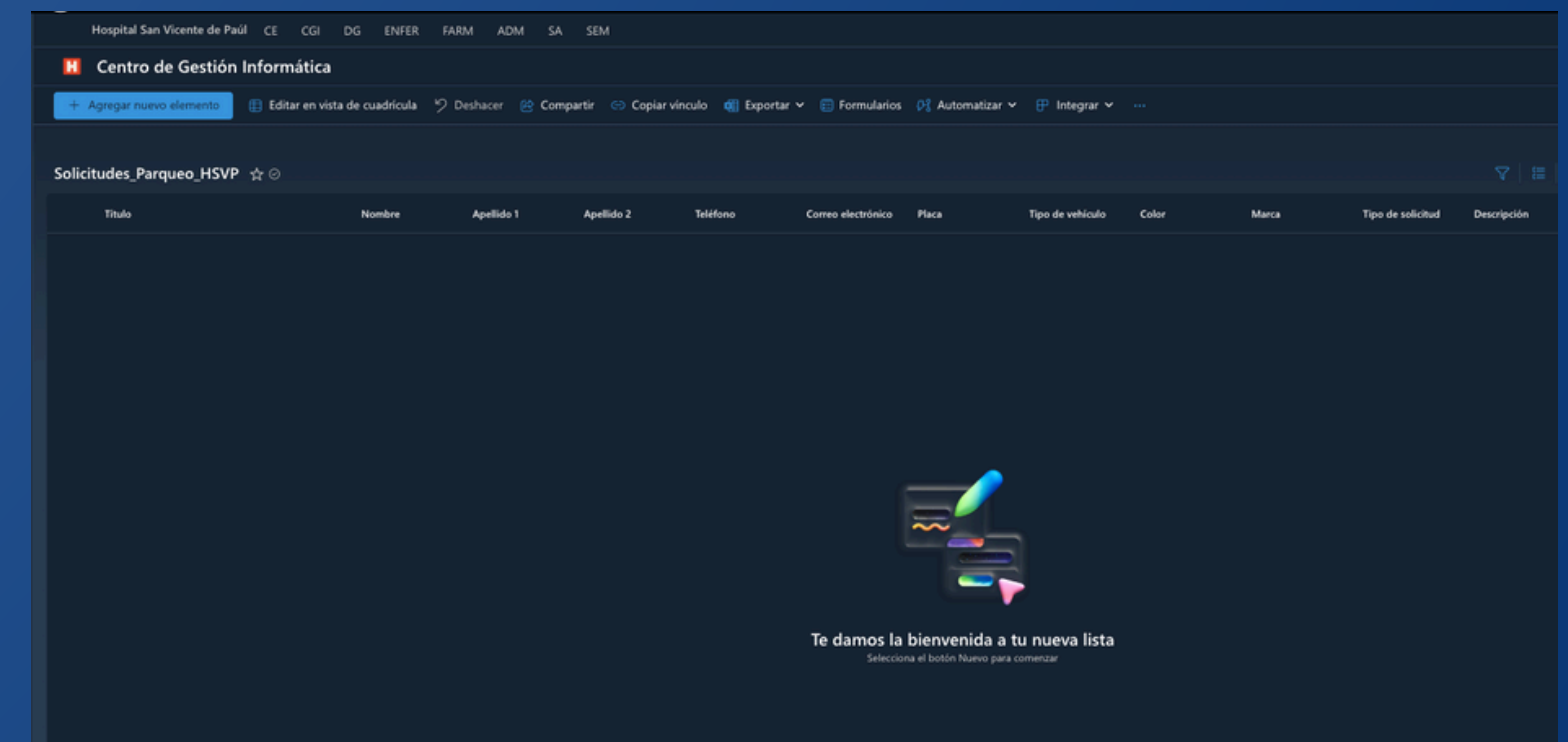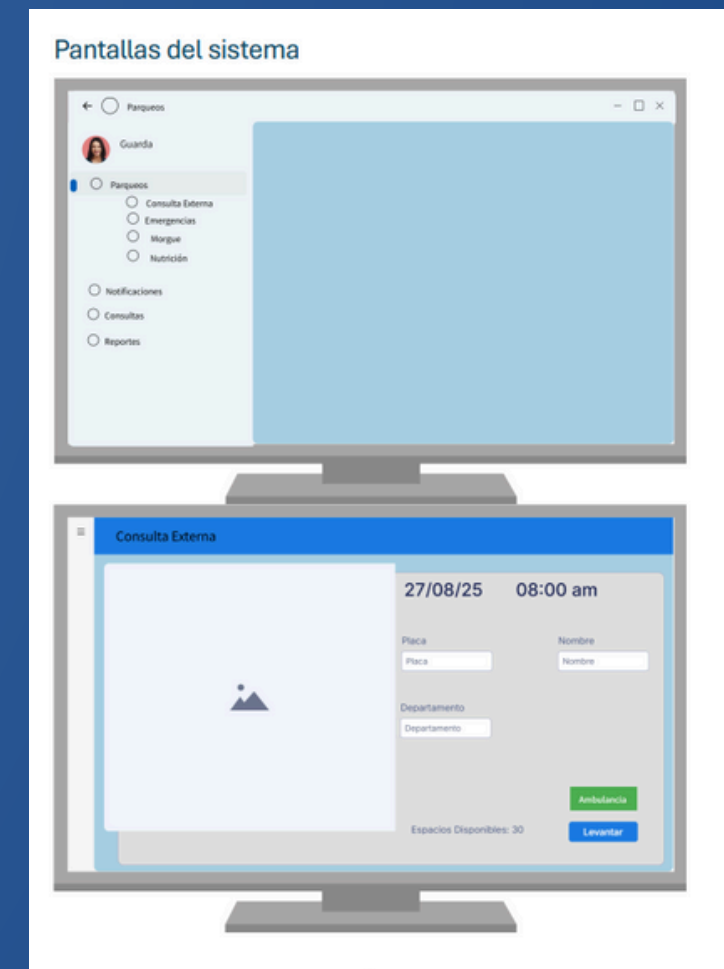

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Durante estas semanas se estableció comunicación directa con las empresas y unidades involucradas, permitiendo definir con claridad:

- Los requerimientos funcionales del sistema de control de parqueo.
- Los procesos actuales y posibles mejoras en la base de datos de mantenimiento.
- La matriz de riesgos inicial, que permitirá controlar desviaciones del proyecto.
- El diseño preliminar del formulario para la captura de información.




APRENDIZAJES Y REFLEXIÓN

Durante este primer avance se aprendió la importancia de:

- La comunicación efectiva con las partes interesadas para definir correctamente los requerimientos.
- La planificación y priorización de tareas para cumplir con los objetivos semanales.
- El uso de herramientas de gestión como la matriz de riesgos y los formularios estructurados para facilitar el desarrollo del sistema.

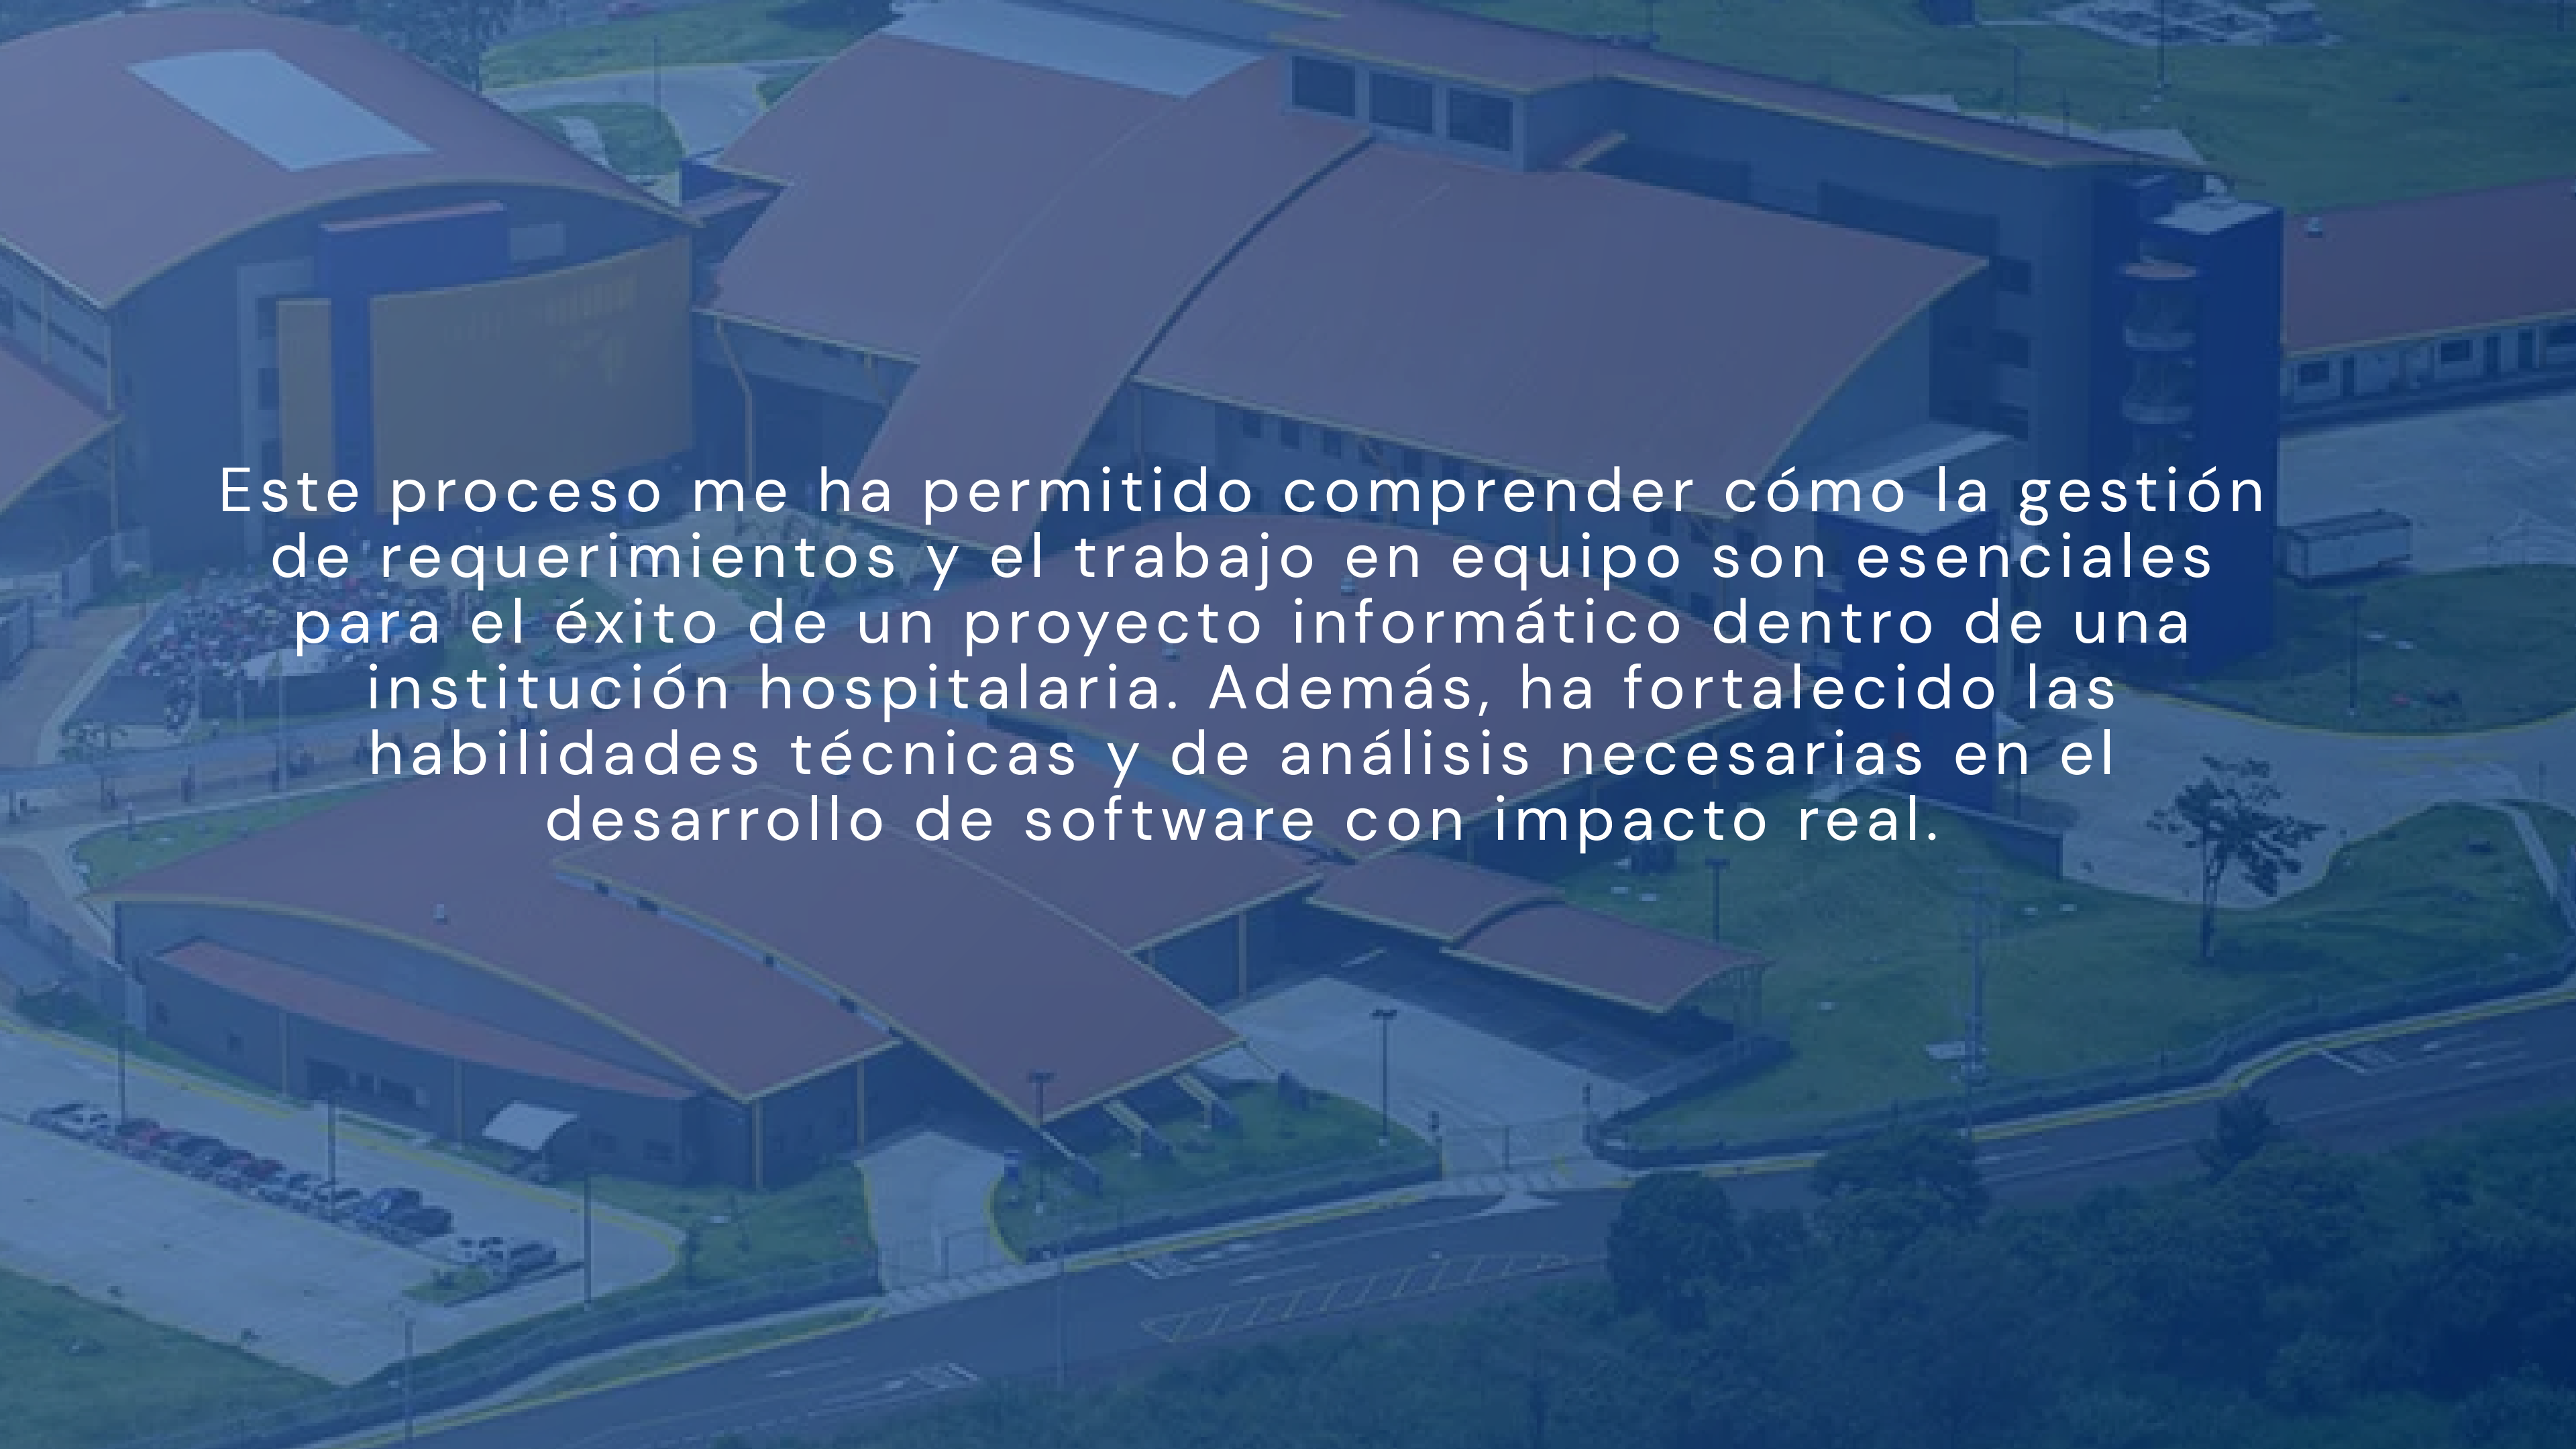

An aerial photograph of a large, modern hospital complex with multiple interconnected buildings and a parking lot. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. Centered on the image is a block of white text.

Este proceso me ha permitido comprender cómo la gestión de requerimientos y el trabajo en equipo son esenciales para el éxito de un proyecto informático dentro de una institución hospitalaria. Además, ha fortalecido las habilidades técnicas y de análisis necesarias en el desarrollo de software con impacto real.

CONCLUSIONES DEL PRIMER AVANCE

- Se cumplió con el cronograma establecido para las primeras semanas.
- Se identificaron los requerimientos clave del sistema.
- Se elaboró y avanzó significativamente en la matriz de riesgos.
- Se encuentran sentadas las bases para iniciar el diseño de la base de datos y prototipos en la siguiente fase.

